

2024—TKST
0020

江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程

水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

编制单位：江苏通凯生态科技有限公司

2024年5月

目 录

江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持方案报告表	1
方案报告表补充说明	3
1 项目简况	3
1.1 项目概况	3
1.1.1 项目基本情况	3
1.1.2 项目组成情况	4
1.1.3 工程布置情况	5
1.1.4 工程占地情况	7
1.1.5 土石方平衡情况	10
1.1.6 项目施工进度情况	15
1.2 项目区概况	13
1.2.1 地形地貌	13
1.2.2 地质地震	14
1.2.3 水系情况	14
1.2.4 气候特征	14
1.2.5 土壤和植被	14
1.3 水土保持分析与评价	15
1.4 水土流失防治目标及防治责任范围	15
1.4.1 设计水平年	16
1.4.2 防治目标	15
1.4.3 防治责任范围	16
2 水土流失预测与水土保持措施布设	18
2.1 水土流失预测	18
2.1.1 预测单元	18
2.1.2 预测时段	18
2.1.3 土壤侵蚀模数	18
2.1.4 预测结果	20
2.1.5 水土流失危害分析	20
2.2 水土保持措施布设	21
2.2.1 水土保持措施总体布局	21

2.2.2 分区措施布设	22
2.2.3 水土保持措施工程量汇总	22
2.2.4 防治措施进度安排	25
3 水土保持投资估算及效益分析	26
3.1 投资估算成果	27
3.2 效益分析	27
3.2.1 水土流失治理度	28
3.2.2 土壤流失控制比	29
3.2.3 渣土防护率	29
3.2.4 表土保护率	29
3.2.5 林草植被恢复率	29
3.2.6 林草覆盖率	30
3.2.7 六项指标达标情况	31
3.3 水土保持管理	31
3.3.1 组织管理	31
3.3.2 后续设计	32
3.3.3 水土保持监测和监理	32
3.3.4 水土保持施工	32
3.3.5 水土保持设施验收	32

附图

附图 1 项目地理位置图

江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 水土保持方案报告表

项目概况	位置	项目位于扬州市经济开发区八里镇。			
	建设内容	<p>项目为线型工程，新建线路路径长 2.96km，改造架空线路路径长 0.77km，新建杆塔 4 基，均采用灌注桩基础；新建电缆线路路径长 2.19km；拆除 1 基角钢塔。具体包括：</p> <p>(1) 六圩~晶山 π 入西园 110 千伏线路工程：新建线路路径长约 1.44km，其中改造架空线路路径长约 0.13km，新建 2 基钢管杆，均为灌注桩基础；新建四回电缆线路路径长 1.31km，采用排管、顶管、电缆沟及电缆井结合的方式敷设。</p> <p>(2) 古渡~港口 π 入西园 110 千伏线路工程：新建线路路径长约 1.52km，其中改造架空线路路径长约 0.64km，新建 2 基角钢塔，均为灌注桩基础，拆除 1 基角钢塔；新建四回电缆线路路径长 0.88km，采用排管、顶管、电缆沟及电缆井结合的方式敷设。</p>			
	建设性质	新建输变电工程	总投资 (万元)	/	
	土建投资 (万元)	/	占地面积 (m ²)	永久: 255	临时: 37045
	动工时间	2024 年 11 月	完工时间	2025 年 4 月	
	土石方 (m ³)	挖方	填方	借方	余 (弃) 方
		18598	18598	0	0
	取土 (石、砂) 场	/			
弃土 (石、砂) 场	/				
项目区概况	涉及重点防治区情况	江苏省省级及扬州市市级水土流失重点预防区	地貌类型	长江三角洲冲积平原	
	原地貌土壤侵蚀模数 [t/km ² ·a]	150	容许土壤流失量 [t/km ² ·a]	500	
项目选址 (线) 水土保持评价		<p>项目选址 (线) 不涉及国家级水土流失重点治理区和重点预防区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。但本工程无法避让江苏省省级、扬州市市级水土流失重点预防区，水土流失防治标准将采用南方红壤区一级标准。施工期间采取了灌注桩基础代替大开挖基础等优化施工工艺；严格控制占地面积；加强表土资源保护；设置泥浆沉淀池措施，避免泥浆外排；设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此，项目无重大水土保持制约因素。</p>			
预测水土流失总量 (t)		77.73			
防治责任范围 (m ²)		37300			
防治标准等级及目标	防治标准等级	南方红壤区一级标准			
	水土流失治理度 (%)	98	土壤流失控制比	1.0	
	渣土防护率 (%)	99	表土保护率 (%)	92	
	林草植被恢复率 (%)	98	林草覆盖率 (%)	27	
水土保持措施	防治分区	工程措施	植物措施	临时措施	
	塔基区	表土剥离 178m ³ 土地整治 1798m ²	撒播草籽 644m ²	泥浆沉淀池 4 座 防尘网苫盖 1000m ² 土质排水沟 270m 土质沉沙池 4 座	
	跨越场区	土地整治 200m ²	撒播草籽 200m ²	彩条布铺垫 180m ²	
	施工道路区	土地整治 1260m ²	撒播草籽 750m ²	铺设钢板 1100m ²	

	电缆施工区	表土剥离 1814m ³ 土地整治 33963m ²	撒播草籽 9105m ²	泥浆沉淀池 4 座 防尘网苫盖 27000m ² 土质排水沟 2567m 土质沉沙池 12 座
水土保持 投资估算 (万元)	工程措施	20.32	植物措施	2.16
	临时措施	27.61	水土保持补偿费	3.73
	独立费用	建设管理费		1.00
		水土保持监理费		1.25
		设计费		5.00
总投资	70.87			
编制单位	江苏通凯生态科技有限公司		建设单位	国网江苏省电力有限公司 扬州供电分公司
法人代表 及电话	徐玉奎 /		法人代表 及电话	秦 健 /
地址	南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 C9 栋 3 楼		地址	扬州市维扬路 179 号
邮编	211100		邮编	225009
联系人 及电话	余志宏		联系人 及电话	黄一芄
电子信箱	/		电子信箱	/
传真	/		传真	/

方案报告表补充说明

1 项目简况

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

建设地点：项目位于扬州市经济开发区八里镇。

建设必要性：拟建的 220kV 西园变位于扬州经济开发区，随着区域内 110 千伏负荷快速增长，以及瑞声科技等新增用电用户，为了减轻 220 千伏六圩变供电压力，满足开发区用户接入要求，同时加强现有网架结构，提高区域供电可靠性，需同步建设 110 千伏配套出线，将古渡变、六圩变部分负荷调整至西园变供电。因此国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司建设江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程具有必要性。

前期工作：（1）2023 年 2 月 28 日，扬州市自然资源和规划局扬州经济技术开发区分局以《关于扬州 220 千伏西园变站址及其配套线路规划意见的函》同意了本工程线路路径，见附件 4；（2）2023 年 9 月 1 日，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司以《国网扬州供电公司关于西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程（SD25110YZ）可行性研究的意见》（扬供电发展〔2023〕218 号）通过了本工程可研，见附件 3；（3）2024 年 2 月 21 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于无锡川埠 220 千伏输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2024〕194 号）对本工程核准进行了批复，见附件 2；本工程架空线路跨越水泥厂河，电缆线路穿越马港河和水泥厂河，均为扬州市经济开发区区级管辖河流建设单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司已开展本工程防洪影响评价招标工作，涉及防洪段线路需取得洪评许可后方可开工建设，建设单位洪评承诺见附件 6。

工程规模：本工程为线型工程，新建线路路径长 2.96km，改造架空线路路径长 0.77km，新建杆塔 4 基，均采用灌注桩基础；新建电缆线路路径长 2.19km；拆除 1 基角钢塔。具体包括：

（1）六圩~晶山 π 入西园 110 千伏线路工程：新建线路路径长约 1.44km，其中改造架空线路路径长约 0.13km，新建 2 基钢管杆，均为灌注桩基础；新建四回电缆线路路径长 1.31km，采用排管、顶管、电缆沟及电缆井结合的方式敷

设。

(2) 古渡~港口 π 入西园 110 千伏线路工程: 新建线路路径长约 1.52km, 其中改造架空线路路径长约 0.64km, 新建 2 基角钢塔, 均为灌注桩基础, 拆除 1 基角钢塔; 新建四回电缆线路路径长 0.88km, 采用排管、顶管、电缆沟及电缆井结合的方式敷设。

工程占地: 工程总占地 37300m², 其中永久占地 255m², 临时占地 37045m²; 占地类型为耕地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地。

工程挖填方: 工程挖填方总量 37196m³, 其中挖方总量 18598m³ (表土剥离 1992m³), 填方总量 18598m³ (表土回覆 1992m³), 无余方, 无外借土方。

工期安排: 工程计划于 2024 年 11 月开工, 2025 年 4 月完工, 总工期 6 个月。

工程投资: 工程总投资/万元, 其中土建投资约/万元。

1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司统一建设。经济技术指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目主要经济技术指标表

一、基本概况			
项目名称	江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	工程性质	新建输变电工程
建设单位	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	建设期	2024.11-2025.04
建设地点	扬州市经济开发区八里镇	总投资	/万元
电压等级	110kV	土建投资	/万元
工程规模	<p>本项目共改造架空线路路径长 0.77km, 新建杆塔 4 基, 均采用灌注桩基础; 新建电缆线路路径长 2.19km; 拆除 1 基角钢塔。具体包括:</p> <p>(1) 六圩~晶山π入西园 110 千伏线路工程: 新建线路路径长约 1.44km, 其中改造架空线路路径长约 0.13km, 新建 2 基钢管杆, 均为灌注桩基础; 新建四回电缆线路路径长 1.31km, 采用排管、顶管、电缆沟及电缆井结合的方式敷设。</p> <p>(2) 古渡~港口π入西园 110 千伏线路工程: 新建线路路径长约 1.52km, 其中改造架空线路路径长约 0.64km, 新建 2 基角钢塔, 均为灌注桩基础, 拆除 1 基角钢塔; 新建四回电缆线路路径长 0.88km, 采用排管、顶管、电缆沟及电缆井结合的方式敷设。</p>		
二、项目组成			
架空经济技术指标			
电压等级	110kV		
改造架空线路长度	0.77km		
杆塔使用基数	新建钢管杆 2 基、角钢塔 2 基, 均为灌注桩基础		

导线型号	2 × JL/G1A-300/25
地线型号	OPGW-120
拆除架空线路	拆除角钢塔 1 基
电缆经济技术指标	
电压等级	110kV
新建电缆线路长度	2.19km
电缆敷设方式	排管、电缆沟井、顶管

1.1.3 工程布置情况

(1) 平面布置

① 六圩 ~ 晶山 π 入西园 110 千伏线路工程

拟建线路自 110kV 六里/六山线 23#-24#耐张段档内将 110kV 六山线开断后电缆引下，穿越马港河路后，沿水泥厂河南侧向东敷设，沿河前进至金春路西侧右转进 220kV 西园变，形成六圩~西园一回线路、晶山~西园一回线路。

② 古渡 ~ 港口 π 入西园 110 千伏线路工程

拟建线路自 110kV 古六/古港线 18#、20#塔将 110kV 古港线开断后电缆引下，沿水泥厂河东侧向南敷设穿越水泥厂河，向东穿过马港河路后，沿水泥厂河南侧前进至金春路西侧右转进 220kV 西园变，形成古渡~西园一回线路、港口~西园一回线路。



图 1.1-3 新建线路路径图

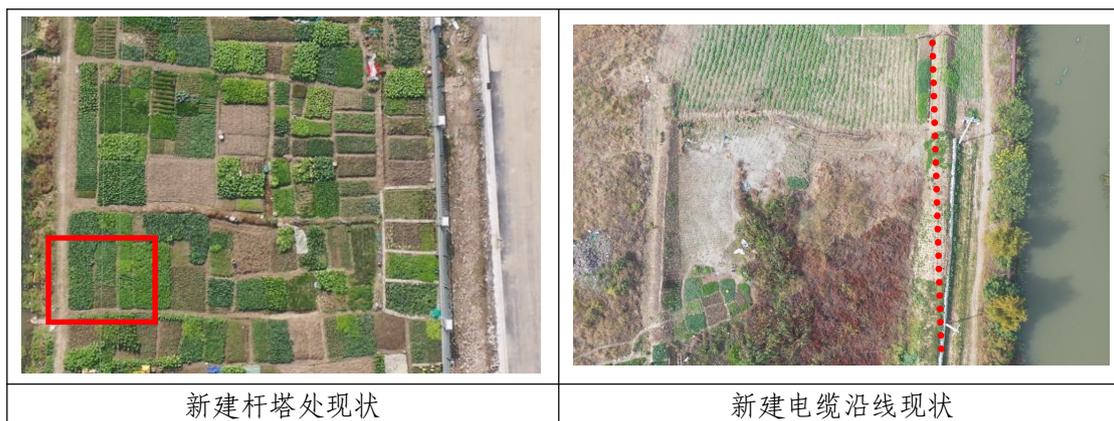


图 1.1-4 本工程现状照片

(2) 竖向设计

本工程地貌类型单一，地势平坦，沿线高程为 3.5~4.4m（1985 国家高程基准），高程起伏较小，沿线以农田和绿化带为主。

(3) 施工组织

① 施工用水、排水、用电、通信系统

用水: 本工程施工水源采取市政自来水取水与附近河流抽水取水相结合的方案。

排水: 本工程施工过程中的雨水通过排水沟收集、经沉沙池沉淀后排入临近道路的市政雨污水管网或附近的排水沟中。本工程外排雨水均通过沉沙池沉淀处理，且外排水量较小，不会对市政雨污水管网或附近的沟渠造成影响。

用电: 本工程施工过程中用电根据周边设施情况安排, 周围已有用电用户区, 可按照安全用电规定引接用于施工用电, 无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。

通信: 本工程施工场地内施工人员相对较少, 可利用无线通信设备进行联络。

② 施工生产生活区

本工程根据沿线的交通情况, 拟租用已有库房或场地作为材料站, 具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定, 便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散; 此外线路施工时由于线路塔基及电缆较分散, 施工周期不长, 因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。

③ 临时堆土区

塔基施工开挖的土方堆放在塔基临时施工场地内设置的临时堆土区, 堆土用防尘网进行苫盖, 施工后期全部回填并压实平整; 电缆施工开挖的土方临时堆放

在电缆通道一侧，并采取防尘网进行苫盖，施工后期全部回填并压实平整。表土在区域内单独设置堆土场地与其他土方分开。临时堆土边坡比不大于 1:1.0，堆土高度不超过 2m。

④施工道路

本工程施工对外交通主要解决建筑材料、塔材和牵引张拉设备等运输问题。建筑材料、塔材和牵引张拉设备运输可以利用沿线附近的县道、乡道、村道通行。现有交通条件能基本满足建筑材料、塔材和牵引张拉设备运输要求，但塔基和电缆位于农田、绿化带之中，需要临时开辟道路，以满足材料运输要求。新开辟的道路铺设钢板进行保护。本工程需开辟施工临时道路共 315m，道路平均宽度 4m，因此施工道路总占地面积为 1260m²。

⑤牵张场设置

本工程改造架空线路路径长 0.77km，线路较短，可利用新建塔基区域进行牵张拉线，无需另外单独设置牵张场。

⑥跨越施工场地

本工程沿线需跨越 1 次新河路，1 次水泥厂河；跨越新河路、水泥厂河紧邻，线路可共用 1 处跨越施工场地。结合现场跨越情况综合考虑共布置 1 处跨越施工场地，占地面积为 200m²，因此跨越场总占地面积为 200m²。

表 1.1-3 工程主要跨越情况统计表

序号	跨越对象	备注
1	道路	1 次新河路
2	河流	1 次水泥厂河
合计		跨越新河路、水泥厂河紧邻处，线路可共用 1 处跨越施工场地。结合现场跨越情况综合考虑共布置 1 处跨越施工场地，占地面积为 200m ² ，因此跨越场总占地面积为 200m ² 。

(4) 施工工艺

①塔基施工

1) 表土剥离保护

塔基开挖前做好表层土壤的剥离和保护，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，顶部采用防尘网做好临时苫盖。

2) 灌注桩基础

灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔：成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的粘性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。护壁泥浆与

钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。当钻孔达到规定深度后，安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的泥浆被抽吸出来，施工结束后，泥浆在泥浆沉淀池中沉淀干化，就地深埋于施工区域 1.0m 以下。每基灌注桩基础施工场地需设置一个泥浆沉淀池。

3) 杆塔拆除施工

杆塔拆除施工工艺流程为：现场勘测→停电验电→拆除附件→拆除导、地线→拆除金具、回收导线→拆除杆塔、回收塔材→拆除基础、破碎深埋→施工场地清理。本工程采用分段分片方法拆除铁塔。由于拆除塔基较分散，每基塔产生的建筑垃圾较少，考虑就地破碎回填至地表以下 1.0m，以不影响植被恢复。

② 电缆施工

采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，施工顺序为：测量定线→清除障碍物→平整工作带→管沟开挖→钢管运输、布管→组装焊接→下沟→回填→竣工验收。开挖前先剥离表层土，临时堆土顶部采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。

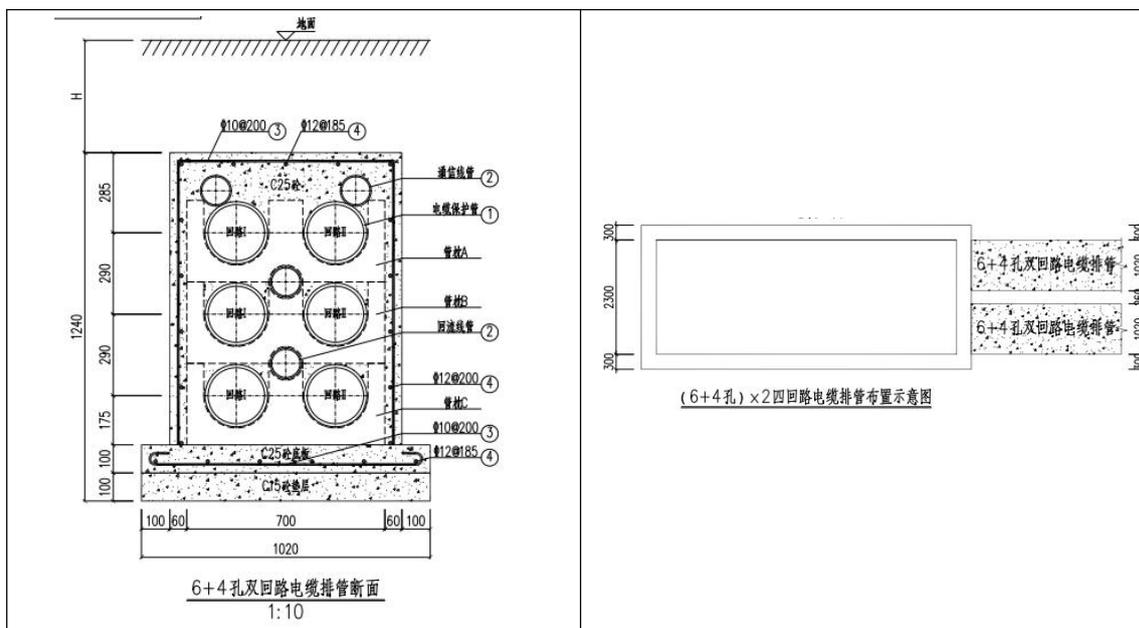


图 1.1-5 四回路电缆排管土建断面图

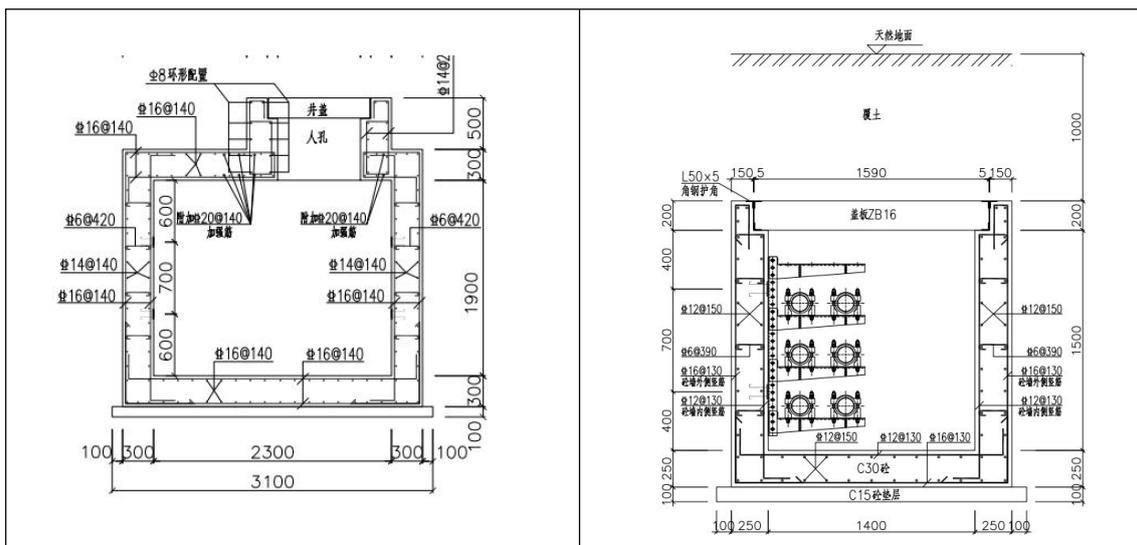


图 1.1-6 电缆井土建断面图

图 1.1-7 电缆沟土建断面图

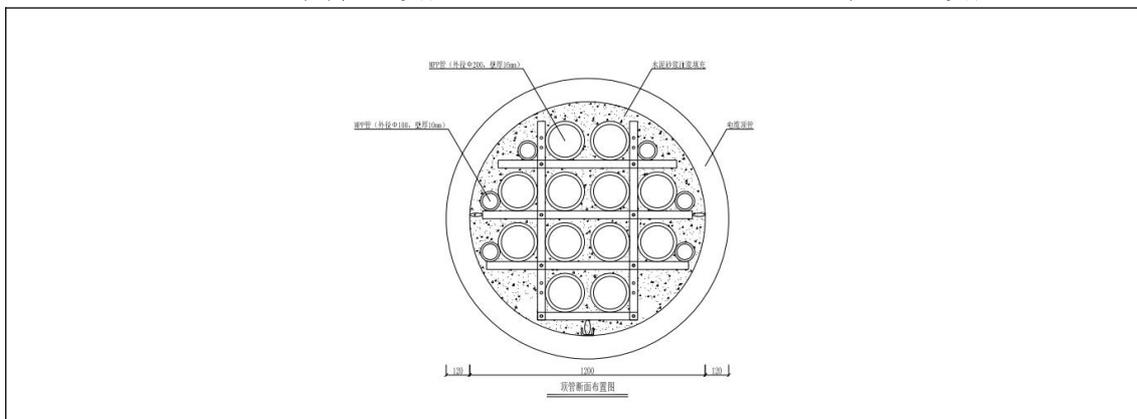


图 1.1-8 顶管土建断面图

1.1.4 工程占地情况

工程总占地面积约为 37300m²，其中永久占地为 255m²，含塔基区永久占地 188m²、电缆施工区永久占地 67m²；临时占地为 37045m²，含塔基区临时占地 1622m²、跨越场区临时占地 200m²、施工道路区临时占地 1260m²、电缆施工区临时占地 33963m²。

(1) 塔基区

根据现场勘查和查阅设计文件，本工程新建 2 基钢管杆和 2 基角钢塔。新建钢管杆施工总占地按每基 18m × 18m 计算，永久占地按 (根径+2m)² 计算；新建角钢塔施工总占地按每基 (根开+16m)² 计算，永久占地按每基 (根开+2m)² 计算；拆除角钢塔 1 基，施工总占地按每基 100m² 计算。

塔基区总占地面积 1810m²，其中永久占地 188m²，临时占地 1622m²。本工程杆塔型式及占地面积详见表 1.1-4。

(2) 跨越场区

根据现场勘查和查阅设计文件，线路沿线共设置跨越场地 1 处，占地面积为 200m²。因此，本工程跨越场区总占地面积为 200m²，为临时占地。

(3) 施工道路区

根据现场勘查和查阅设计文件，本工程需布设施工临时道路共 315m，道路平均宽度 4m。因此，施工临时道路总占地面积为 1260m²，为临时占地。

(4) 电缆施工区

根据现场勘查和查阅设计文件，本工程电缆通道土建长度 2190m。排管、电缆沟井开挖作业宽度以一侧外扩 4m、一侧外扩 8m 计算，总占地面积按 $L \times (W+12)$ 计算。顶管施工占地主要为顶管两头施工占地，共 4 处顶管（其中顶管穿越马港河路 and 水泥厂河共用 1 处接收井），本工程共建设 4 处工作井和 3 处接收井，工作井平均每处占地面积为 1023m²，总占地为 4092m²；接收井平均每处占地面积为 783m²，总占地为 2349m²，完工后排管、电缆沟顶部覆土，无永久占地；电缆井顶部人孔井盖为永久占地，根据设计资料，每个电缆井永久占地约 2m²；顶管工作井及接收井顶部人孔井盖为永久占地，根据设计资料每个井永久占地约 1m²。电缆施工区总占地面积 34030m²，其中永久占地 67m²，临时占地 33963m²。本工程电缆通道型式及占地面积详见表 1.1-5。

本工程各分区占地情况见表 1.1-6。

表 1.1-6 工程分区占地情况统计表

单位：m²

工程分区	占地性质		占地面积	占地类型		
	永久	临时		公共管理与公共服务用地	交通运输用地	耕地
塔基区	188	1622	1810	0	648	1162
跨越场区	0	200	200	0	200	0
施工道路区	0	1260	1260	0	750	510
电缆施工区	67	33963	34030	2380	9137	22513
合计	255	37045	37300	2380	10735	24185

注：本工程占用的公共管理与公共服务用地为 220 千伏西园变规划用地，现状为农田，后期恢复原貌；占用的交通运输用地为绿化带。

1.1.5 土石方平衡情况

(1) 塔基区

塔基区占用耕地、绿化带，可剥离表土厚度约 0.3m，施工前期对塔基区塔基永久占地、泥浆沉淀池、拆除基础等开挖区域进行表土剥离，剥离面积 592m²，江苏通凯生态科技有限公司

表土剥离量为 178m³。剥离的表土堆放在塔基区的临时堆土区域，临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工后期对塔基区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土回覆利用，表土回覆量为 178m³。

通过现场勘查，拆除角钢塔开挖面约 16m²/基，挖深约 1.5m，产生建筑垃圾约 6m³/基，挖方量共 24m³（建筑垃圾 6m³）。本工程拆除杆塔考虑就地破碎回填至地表以下 1.0m，以不影响植被恢复。填方量共 24m³（建筑垃圾 6m³）。无余方，无外购土方。

通过表 1.1-6 计算可得，全线塔基基础开挖产生的钻渣和泥浆沉淀池开挖产生的土方共约为 1202m³。施工期在塔基区四周需设置土质排水沟，每基钢管杆按 60m 计，每基角钢塔按 75m 计，共计开挖排水沟 270m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 22m³。在每基塔排水沟末端设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为 4.0m×3.0m×1.0m，单个沉沙池容积为 6m³，共计 4 座，开挖土方 24m³。

综上所述，塔基区挖方量 1450m³（表土剥离 178m³），填方量 1450m³（表土回覆 178m³），无余方，无外购土方。

（2）跨越场区

跨越场区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故跨越场区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

（3）施工道路区

施工道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工道路区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

本区不存在一般基础土方开挖与回填。

（4）电缆施工区

电缆施工区主要占用公共管理与公共服务用地、耕地、绿化带，区域可剥离表土厚度约 0.3m，施工前期对电缆施工开挖区域进行表土剥离，剥离面积 6046m²，表土剥离量为 1814m³。剥离的表土堆放在开挖区域一侧的临时堆土区域，临时

堆土采用防尘网临时苫盖。施工结束后对电缆施工区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土回覆利用，表土回覆量为 1814m³。

通过现场勘查和查阅设计资料，本工程新建电缆基础挖填土方情况统计见表 1.1-8。

通过上表计算可得，全线电缆基础开挖产生的土方共约为 15057m³。施工期在电缆开挖一侧及顶管施工区域四周设置土质排水沟，共计开挖 2567m，排水沟断面尺寸为上口宽 0.6m，下口宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 205m³，并在排水沟转角及末端设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为 4.0m×3.0m×1.0m，单个沉沙池容积为 6m³，共计 12 座，开挖土方 72m³。

综上所述，电缆施工区挖方量 17148m³（表土剥离 1814m³），填方量 17148m³（表土回覆 1814m³），无余方，无外购土方。

（5）工程土石方汇总

本工程土石方开挖总量为 18598m³（表土剥离 1992m³），回填总量 18598m³（表土回覆 1992m³），无余方，无外借土方。

表 1.1-9 土石方挖填平衡情况表 单位：m³

分区	挖方量		填方量		借方	余方
	表土	基础	表土	基础		
塔基区	178	1272	178	1272	0	0
跨越场区	0	0	0	0	0	0
施工道路区	0	0	0	0	0	0
电缆施工区	1814	15334	1814	15334	0	0
小计	1992	16606	1992	16606	0	0
合计	18598		18598		0	0

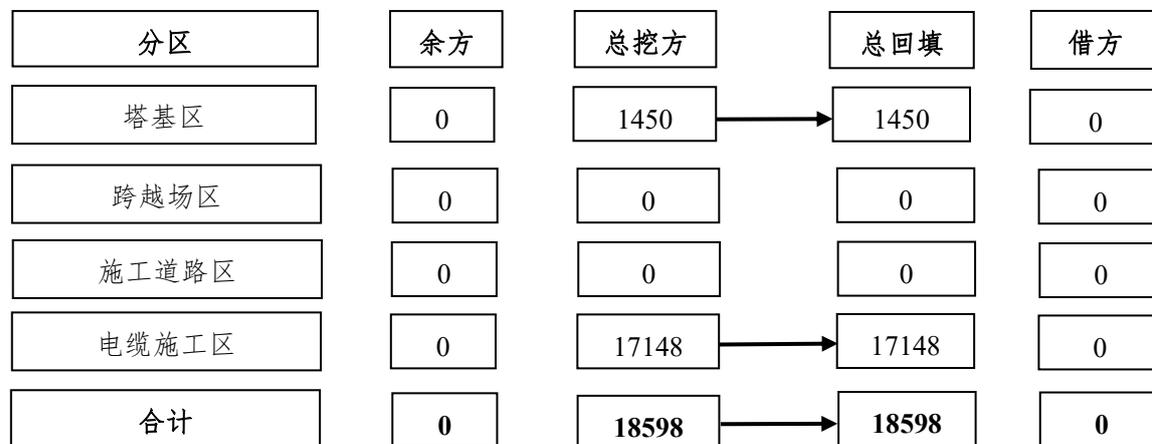
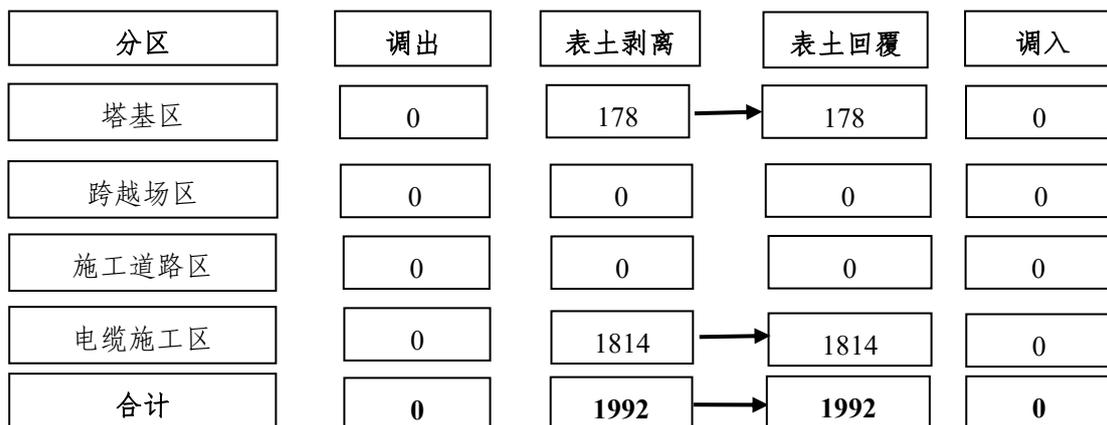


图 1.1-9 土石方平衡流向框图 单位：m³

表 1.1-10 表土剥离及回覆平衡一览表

单位: m³

分区	表土剥离	表土回覆	调入	调出	借方	综合利用
塔基区	178	178	0	/	0	0
跨越场区	0	0	/	/	0	0
施工道路区	0	0	/	/	0	0
电缆施工区	1814	1814	0	/	0	0
合计	1992	1992	0	0	0	0

图 1.1-10 表土剥离平衡流向框图 单位: m³

1.1.6 项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-11。

表 1.1-11 项目主体工程施工进度表

工作项目		施工期					
		2024 年		2025 年			
		11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
杆塔施工	基础施工				■		
	杆塔组立					■	
	架线施工					■	
	拆除施工					■	
	场地整理						■
电缆施工	基础施工	■	■	■			
	电缆敷设				■	■	
	场地整理					■	■

1.2 项目区概况

1.2.1 地形地貌

本工程所在区域地貌类型属长江三角州平原。线路沿线场地现状主要为农田、绿化带，地势较为平坦，沿线高程为 3.5m~4.4m，水系发育，交通条件较为便利。

1.2.2 地质地震

本工程所在区域地基土主要由第四系全新统冲、淤积成因的粉质粘土、粉土夹淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉砂及粉砂等组成，上部存在耕土及填土。

根据《中国地震动参数区划图》的规定，项目区所在场地的基本地震动峰值加速度为 0.15g（相应的地震基本烈度为Ⅶ度），基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.65s。

1.2.3 水系情况

扬州市经济开发区南临长江，东濒邵伯湖、淮河入江水道及京杭大运河。古运河流经区境西南从古镇瓜洲入长江。长江、淮河过境，河湖沟渠密布。

境内主干流淮河入江水道自邵伯湖三棵柳（邗江、高邮交界处）起南穿邵伯湖，经凤凰河、廖家沟至三江营入长江，全长 58.06km，在邵伯湖六闸以下分别注入运盐河、金湾河、太平河、凤凰河、新河、壁虎河、廖家沟、芒稻河、夹江等 9 条河流。本工程架空线路跨越水泥厂河，未在河中立塔；电缆穿越水泥厂河和马港河，均属于扬州市经济开发区级管辖河道。

1.2.4 气候特征

扬州市地处亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨量充沛、日照充足、冬寒夏热和雨热同步等。根据扬州市气象站 1965~2022 年常规资料统计结果，各气象要素特征值见表 1.2-1。

表 1.2-1 项目区域气象特征值一览表

项目	内容		单位	数值
气温	平均	全年	°C	15.4
	极值	最高	°C	40.8 (2013.8.7)
		最低	°C	-15.8 (1969.2.6)
降水	平均	多年	mm	1033.2 (1965-2020)
	最大年降水量	多年	mm	1645.1 (1991)
	最小年降水量	多年	mm	600 (1978)
相对湿度	多年平均		%	78
风速	多年年均		m/s	3.4
风向	全年主导风向		/	SE
	夏季		/	SE
	冬季		/	NW
无霜期	全年		d	235
蒸发量	全年平均		mm	900

1.2.5 土壤和植被

扬州市经济开发区位于长江下游区域，属长江三角洲平原区，地势平缓。通过现场勘察，土壤类型主要以水稻土、潮土及沼泽土为主，主要占用耕地、绿化带，可剥离表土厚度约 0.3m。

项目区属亚热带常绿阔叶林，植被资源丰富，树木种类繁多。主要有柳、榆、杨、意杨、刺槐等树种，还有杏、桃、李等经济果树，草类则以自然生长的白茅为主，区内低洼湿地区域分布有柴蒲、莲藕、菱角及芦苇等水生植物。扬州市范围内垦殖系数较高，主要种植水稻、小麦、油菜、花生等农作物。经调查，项目所在区林草覆盖率约为 25%。

1.3 水土保持分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区等。依据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的公告（苏水农〔2014〕48号），工程所在地涉及江苏省省级水土流失重点预防区，根据《扬州市水土保持规划（2015-2030年）》，工程所在地涉及扬州市市级水土流失重点预防区。

由于项目选线无法避让江苏省省级水土流失重点预防区和扬州市市级水土流失重点预防区。因此，本工程在主体施工上优化施工工艺，采用灌注桩基础代替大开挖基础；严格控制占地面积；加强表土资源保护；设置泥浆沉淀池措施，避免泥浆外排；设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此，从水土保持的角度分析，本工程无重大水土保持制约因素。

1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

1.4.1 设计水平年

主体工程计划 2024 年 11 月开工，2025 年 4 月完工，因此，确认本方案设计水平年为主体工程完工后的当年，即 2025 年。

1.4.2 防治目标

本项目区所在地位于扬州市经济开发区八里镇境内，根据《江苏省水土保持规划（2015-1780）》，项目区属于南方红壤区——江淮丘陵及下游平原区——江苏通凯生态科技有限公司

江淮下游平原农田防护水质维护区——苏中沿江平原农田防护水质维护区。根据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点预防区》的公告（苏水农〔2014〕48号），本工程涉及江苏省省级水土流失重点预防区。根据《扬州市水土保持规划（2015-2030年）》，工程所在地涉及扬州市市级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行南方红壤区一级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7节规定土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1；4.0.9节规定位于城市区的生产建设项目，渣土防护率和林草覆盖率可提高1%~2%；根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）3.2.2节第4条规定对无法避让的水土流失重点治理区和重点预防区，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。

因此本工程水土流失防治标准如下：施工期渣土防护率应达97%，表土保护率应达92%；至设计水平年，水土流失治理度应达98%，土壤流失控制比应达1.0，渣土防护率应达99%，表土保护率应达92%，林草植被恢复率应达98%，林草覆盖率应达27%。防治目标具体情况见表1.4-1：

表 1.4-1 防治标准指标计算表

指标	标准值		侵蚀强度调整	地理位置调整		方案目标值	
	施工期	设计水平年	微度	城市区	重点预防区	施工期	设计水平年
水土流失治理度（%）	/	98	/	/	/	/	98
土壤流失控制比	/	0.9	+0.1	/	/	/	1.0
渣土防护率（%）	95	97	/	+2	/	97	99
表土保护率（%）	92	92	/	/	/	92	92
林草植被恢复率（%）	/	98	/	/	/	/	98
林草覆盖率（%）	/	25	/	+1	+1	/	27

1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），结合本工程占地概况、水土流失影响分析，对工程建设及生产可能造成水土流失范围进行界定，以确定水土流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为37300m²，其中永久占地为255m²，临时占地为37045m²。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围表 单位: m²

防治分区	占地性质		总占地面积
	永久占地面积	临时占地面积	
塔基区	188	1622	1810
跨越场区	0	200	200
施工道路区	0	1260	1260
电缆施工区	67	33963	34030
防治责任范围	255	37045	37300

2 水土流失预测与水土保持措施布设

2.1 水土流失预测

2.1.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为 37300m²。预测单元为工程建设扰动地表的时段和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元为塔基区、跨越场区、施工道路区和电缆施工区。

2.1.2 预测时段

本工程为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。扬州市雨季主要是 5~9 月份。

本工程施工期为 2024 年 11 月~2025 年 4 月，自然恢复期取完工后 2 年。根据项目本身建设进度，水土流失预测时段情况详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测分区及时段表

阶段	预测单元	施工时段	预测时段 (a)	主要内容
施工期	塔基区	2025.2-2025.4	0.60	塔基基础建设 (每基塔平均施工3个月)
	跨越场区	2025.3-2025.4	0.40	架线施工
	施工道路区	2024.11-2025.4	0.60	车辆占压 (每处平均施工3个月)
	电缆施工区	2024.11-2025.4	1.00	电缆基础开挖
自然恢复期	塔基区	2025.5-2027.4	2.00	无
	跨越场区	2025.5-2027.4	2.00	无
	施工道路区	2025.5-2027.4	2.00	无
	电缆施工区	2025.5-2027.4	2.00	无

2.1.3 土壤侵蚀模数

根据现场勘查项目地形主要为平原，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目所在地土壤侵蚀强度为微度，确定土壤侵蚀模数背景值为 150t/(km²·a)。

本工程施工期各区域侵蚀模数采取类比分析法，通过类比“扬州界首 110 千伏输变电工程”获得。类比工程已于 2022 年 7 月通过了国网江苏省电力有限公司组织的水土保持设施验收，并投入运行，本工程水土保持监测单位为江苏通凯江苏通凯生态科技有限公司

生态科技有限公司，验收单位为江苏核众环境监测技术有限公司。参考性分析对照详见表 2.1-2。

表 2.1-2 参考性分析对照表

项目	江苏扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	扬州界首 110 千伏输变电工程	类比结果
地理位置	扬州市邗江区	扬州市高邮市	相近
气候条件	亚热带湿润季风气候	亚热带湿润季风气候	相同
年平均降水量	1033.2mm	1018.1mm	相近
地形地貌	平原	平原	相同
土壤类型	水稻土	水稻土	相同
水土流失强度	微度水蚀	微度水蚀	相同

表 2.1-3 类比项目实际监测侵蚀模数统计表

预测时段	扬州界首 110 千伏输变电工程(类比)	实际监测侵蚀模数[t/(km ² ·a)]
施工期	变电站区	1600
	塔基区	1600
	牵张场及跨越场区	800
	施工道路区	800
	电缆施工区	1550

本工程与类比工程均为输变电项目，地理位置、多年平均降水量相近，气候条件、地形地貌、土壤类型、水土流失强度等相同，因此本工程与类比工程有一定的可比性。根据各区的施工特点对类比工程的侵蚀模数进行修正后可应用于本工程。

针对本工程的环境条件、施工条件和防护措施条件等实际情况，对扰动地表后侵蚀模数的取值，在下列三个方面进行修正。

1) 环境条件：本工程多年平均降水量为 1033.2mm，类比工程的多年平均降水量为 1018.1mm，相差较小，因此，设置修正系数为 1.0。

2) 扰动强度：本工程土石方工程量和扰动地表的强度与类比工程相似，差别较小，因此，设修正系数 1.0。

3) 防护措施条件：类比工程所列监测结果是在工程施工过程中采取了一定的水土保持措施的基础上进行监测的，若施工过程中不采取任何措施，则工程扰动后的土壤侵蚀模数将会比监测结果大。而水土流失量预测的基础是按生产建设项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量。因此，

设置修正系数为 1.2。

自然恢复期：项目建成，植被种植完成后，开始发挥保水保土的作用，塔基区和电缆施工区除硬化部分，自然恢复期水土流失治理达标，最终土壤侵蚀模数低于背景值，各防治分区的侵蚀模数见表 2.1-4。

表 2.1-4 扰动后土壤侵蚀模数类比表

预测时段	扬州界首 110 千伏输变电工程 (类比)		调整系数			扬州西园 220 千伏变电站 110 千伏 送出工程 (本期)	
	防治分区	监测土壤侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	环境条件	扰动条件	防护措施	防治分区	预测土壤侵蚀模数[t/(km ² ·a)]
施工期	塔基区	1600	1.0	1.0	1.2	塔基区	1920
	牵张场及跨越场区	800	1.0	1.0	1.2	跨越场区	960
	施工道路区	800	1.0	1.0	1.2	施工道路区	960
	电缆施工区	1550	1.0	1.0	1.2	电缆施工区	1860

2.1.4 预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生土壤流失量，结果见表 2.1-5。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生土壤流失总量为 77.73t，新增土壤流失量为 61.19t。

表 2.1-5 项目水土流失量预测计算成果表

预测时段	预测单元	面积 (m ²)	预测时段 (a)	侵蚀模数背景值[t/(km ² ·a)]	背景流失量 (t)	扰动后侵蚀模数[t/(km ² ·a)]	流失总量 (t)	新增流失量 (t)	新增占比 (%)
施工期	塔基区	1810	0.60	150	0.16	1920	2.09	1.93	99.40
	跨越场区	200	0.40	150	0.01	960	0.08	0.07	
	施工道路区	1260	0.60	150	0.11	960	0.73	0.62	
	电缆施工区	34030	1.00	150	5.10	1860	63.30	58.20	
小计	/	37300	/	/	5.38	/	66.20	60.82	
自然恢复期第一年	塔基区	1798	1.00	150	0.27	160	0.29	0.02	0.60
	跨越场区	200	1.00	150	0.03	160	0.03	0	
	施工道路区	1260	1.00	150	0.19	160	0.20	0.01	
	电缆施工区	33963	1.00	150	5.09	160	5.43	0.34	
小计	/	37221	/	/	5.58	/	5.95	0.37	
自然恢复期第二年	塔基区	1798	1.00	150	0.27	120	0.22	/	0
	跨越场区	200	1.00	150	0.03	120	0.02	/	

预测时段	预测单元	面积 (m ²)	预测时段 (a)	侵蚀模数背景值 [t/(km ² ·a)]	背景流失量 (t)	扰动后侵蚀模数 [t/(km ² ·a)]	流失总量 (t)	新增流失量 (t)	新增占比 (%)
	施工道路区	1260	1.00	150	0.19	120	0.15	/	
	电缆施工区	33963	1.00	150	5.09	120	4.08	/	
小计	/	37221	/	/	5.58	/	4.47	/	
合计					16.54		77.73	61.19	100

注：自然恢复期间塔基区和电缆施工区水土流失面积已扣除硬化占地。

2.1.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成水土流失危害，主要包括以下几个方面：

(1) 破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

(2) 项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有防护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

(3) 工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成不良影响。

2.2 水土保持措施布设

2.2.1 水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详见表 2.2-1。

表 2.2-1 防治措施总体布局表

分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	防尘网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池
跨越场区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	/	彩条布铺垫
施工道路区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板	/
电缆施工区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	防尘网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池

2.2.2 分区措施布设

(1) 塔基区

①工程措施

表土剥离：本工程主体设计中已考虑在施工前期对塔基区永久占地、泥浆沉淀池和拆除基础等开挖区域进行表土剥离，剥离面积 592m²，剥离厚度 0.3m，表土剥离量为 178m³。

土地整治：本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区裸露地表进行土地整治，主要包括场地清理、平整、表土回覆，整治面积约 1798m²，表土回覆量为 178m³，整治后的土地 1154m² 交由土地权所有人进行复耕，其余 644m² 进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本工程主体设计中已考虑在施工后期对塔基区占用绿化带区域采取撒播草籽的措施，撒播面积约 644m²，撒播草籽密度 0.015kg/m²，撒播总量约 9.66kg。

③临时措施

泥浆沉淀池：为减少钻孔灌注桩施工过程中产生的水土流失，本工程主体设计中已考虑在施工过程中于塔基区灌注桩基础旁设置泥浆沉淀池，对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理，禁止将钻渣泥浆排入周围农田和河流，共设置 4 座。泥浆沉

淀池采用半挖半填的方式，尺寸根据钻渣泥浆量确定。

防尘网苫盖：本方案补充在施工过程中对塔基区临时堆土及裸露地表进行防尘网苫盖，苫盖面积约 1000m²。

土质排水沟：本方案补充在施工过程中于塔基区四周需设置土质排水沟，每基钢管杆按 60m 计，每基角钢塔按 75m 计，共计开挖排水沟 270m，排水沟断面尺寸为上顶宽 0.6m，下底宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 22m³。

土质沉沙池：本方案补充在施工过程中于每基塔排水沟末端设置土质沉沙池，尺寸长×宽×高为 4.0m×3.0m×1.0m，单个沉沙池容积为 6.0m³，共计 4 座。

(2) 跨越场区

①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对跨越场区全区进行土地整治，整治面积约 200m²，整治后的土地均进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期土地整治之后对跨越场区占用的绿化带区域进行撒播草籽，撒播面积 200m²，撒播草籽密度 0.015kg/m²，撒播总量约 3kg。

③临时措施

彩条布铺垫：本方案补充在施工过程中对跨越场区域裸露地表进行彩条布铺垫，铺垫面积约 180m²。

(3) 施工道路区

①工程措施

土地整治：本方案补充在施工后期对施工道路区全区进行土地整治，整治面积 1260m²，整治后的土地 510m²交由土地权所有人进行复耕，其余 750m²进行植被恢复。

②植物措施

撒播草籽：本方案补充在施工后期土地整治之后对施工道路区占用的绿化带区域进行撒播草籽，撒播面积 750m²，撒播草籽密度 0.015kg/m²，撒播总量约 11.25kg。

③临时措施

铺设钢板：为减少对地表的扰动，本工程主体设计中已考虑在施工过程中对施工道路区内松软路面区域铺设一定数量的 6mm 厚钢板，沿线施工临时道路共

需铺设钢板 1100m²。

(4) 电缆施工区

① 工程措施

表土剥离:本工程主体设计中已考虑在施工前期对电缆施工区开挖区域进行表土剥离,剥离面积 6046m²,剥离厚度 0.3m,表土剥离量为 1814m³。

土地整治:本工程主体设计中已考虑在施工后期对电缆施工区裸露地表进行土地整治,主要包括场地清理、平整、表土回覆,整治面积约 33963m²,表土回覆量为 1814m³,整治后的土地 24858m²交由土地权所有人进行复耕,其余 9105m²进行植被恢复。

② 植物措施

撒播草籽:本工程主体设计中已考虑在施工后期对电缆施工区占用的绿化带区域进行撒播草籽,撒播面积 9105m²,撒播草籽密度 0.015kg/m²,撒播总量约 136.58kg。

③ 临时措施

泥浆沉淀池:为减少顶管施工过程中产生的水土流失,本工程主体设计中已考虑在施工过程中于电缆施工区顶管工作井基础旁设置泥浆沉淀池,对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理,禁止将钻渣泥浆排入周围农田和河流,共设置 4 座。泥浆沉淀池采用半挖半填的方式,尺寸根据钻渣泥浆量确定。

防尘网苫盖:本方案补充在施工过程中对电缆施工区临时堆土及裸露地表进行防尘网苫盖,苫盖面积约 27000m²。

土质排水沟:本方案补充在施工过程中于电缆开挖区一侧及顶管施工区域四周设置土质排水沟,共计开挖排水沟 2567m,排水沟断面尺寸为上口宽 0.6m,下口宽 0.2m,深 0.2m,边坡比 1:1,开挖土方量约 205m³。

土质沉沙池:本方案补充在施工过程中于排水沟转角及末端设置土质沉沙池,尺寸长×宽×高为 4.0m×3.0m×1.0m,单个沉沙池容积为 6m³,共计 12 座,开挖土方 72m³。

2.2.3 水土保持措施工程量汇总

本工程水土保持措施工程量详见表 2.2-2。

表 2.2-2 本工程水土保持措施工程量汇总表

防治分区	措施类型		内容类别	单位	数量	布设位置	结构形式	实施时间		
塔基区	工程措施	主体 已有	表土剥离	m ³	178	塔基永久占地、泥浆沉淀池和拆除塔基等开挖区域	剥离厚度 0.3m, 剥离面积 592m ²	2025.02		
			土地整治	m ²	1798			除硬化外裸露地表	覆土、机械翻耕、施肥	2025.04
	植物措施	主体 已有	撒播草籽	m ²	644	占用绿化带区域	狗牙根草籽 0.015kg/m ²	2025.04		
			临时措施	主体 已有	泥浆沉淀池	座	4	灌注桩基础旁	半挖半填	2025.02
	方案 新增	防尘网苫盖			m ²	1000	塔基区四周	800 目/100cm ² , 长×宽: 8m×40m	2025.02	
		土质排水沟			长度	m		270	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1	2025.02
					土方量	m ³		22		
土质沉沙池	座	4	排水沟末端	土质, 4.0m×3.0m×1.0m	2025.02					
跨越场区	工程措施	方案 新增	土地整治	m ²	200	全区	机械翻耕、施肥	2025.04		
	植物措施	方案 新增	撒播草籽	m ²	200	占用绿化带区域	狗牙根草籽 0.015kg/m ²	2025.04		
	临时措施	方案 新增	彩条布铺垫	m ²	180	裸露地表	三色彩条布	2025.03		
施工道路区	工程措施	方案 新增	土地整治	m ²	1260	全区	机械翻耕、施肥	2025.04		
	植物措施	方案 新增	撒播草籽	m ²	750	占用绿化带区域	狗牙根草籽 0.015kg/m ²	2025.04		
	临时措施	主体 已有	铺设钢板	m ²	1100	松软路面区域	6mm 厚钢板	2024.11- 2025.2		
电缆施工区	工程措施	主体 已有	表土剥离	m ³	1814	电缆施工开挖区域	剥离厚度 0.3m, 剥离面积 6046m ²	2024.11- 2024.12		
			土地整治	m ²	33963			除硬化外裸露地表	覆土、机械翻耕、施肥	2025.03
	植物措施	主体 已有	撒播草籽	m ²	9105	占用绿化带区域	狗牙根草籽 0.015kg/m ²	2025.04		
			临时措施	主体 已有	泥浆沉淀池	座	4	顶管工作井基础旁	半挖半填	2024.11- 2024.12
	方案 新增	防尘网苫盖			m ²	27000	电缆施工区一侧	800 目/100cm ² , 长×宽: 8m×40m	2024.11- 2025.01	
		土质排水沟			长度	m		2567	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1	2024.11- 2025.01
					土方量	m ³		205		
土质沉沙池	座	12	排水沟末端	土质, 4.0m×3.0m×1.0m	2024.11- 2025.01					

2.2.4 防治措施进度安排

参照主体工程施工进度,各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施,相互协调,有序进行。坚持“因地制宜,因害设防”的原则,首先安排水土流失严重区域的防治措施,在措施安排上,工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑,施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排,植物措施可略为滞后,但须根据植物的生物学特性,合理安排季节实施,并在总工期内完成所有水土保持措施。

表2.2-3 主体工程与水土保持工程实施进度表

防治分区	工程名称		施工期					
			2024年		2025年			
			11月	12月	1月	2月	3月	4月
塔基区	主体工程		—————					
	工程措施	表土剥离				-----		
		土地整治						-----
	植物措施	撒播草籽						-----
	临时措施	泥浆沉淀池				-----		
		防尘网苫盖				-----		
		土质排水沟				-----		
土质沉沙池					-----			
跨越场区	工程措施	土地整治					-----	
	植物措施	撒播草籽					-----	
	临时措施	彩条布铺垫				-----		
施工道路区	工程措施	土地整治					-----	
	植物措施	撒播草籽					-----	
	临时措施	铺设钢板	-----	-----	-----	-----		
电缆施工区	主体工程		—————					
	工程措施	表土剥离	-----	-----				
		土地整治					-----	
	植物措施	撒播草籽						-----
	临时措施	泥浆沉淀池	-----	-----				
		防尘网苫盖	-----	-----	-----			
		土质排水沟	-----	-----	-----			
土质沉沙池		-----	-----	-----				

注：“—————”为主体工程进度；“-----”为水土保持措施进

3 水土保持投资估算及效益分析

3.1 投资估算成果

本项目水土保持工程总投资 70.87 万元，其中工程措施投资 20.32 万元；植物措施投资 2.16 万元；临时措施投资 27.61 万元；独立费用 13.25 万元（其中建设管理费 1.00 万元，设计费 5.00 万元，水土保持监理费 1.25 万元，水土保持设施验收费 6.00 万元），基本预备费 3.80 万元，水土保持补偿费 37300 元，计列为 3.73 万元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	主体已有	方案新增	合计
1	第一部分工程措施	19.72	0.60	20.32
2	第二部分植物措施	1.97	0.19	2.16
3	第三部分临时措施	11.04	16.57	27.61
4	第四部分独立费用	6.47	6.78	13.25
	一至四部分合计	39.20	24.14	63.34
5	基本预备费 6%	2.35	1.45	3.80
6	水土保持补偿费	3.73	0	3.73
7	水土保持总投资	45.28	25.59	70.87

表 3.1-2 水土保持工程措施投资估算表 单位：万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
1	塔基区	/	/	/	1.18
1.1	表土剥离*	100m ³	1.78	2490.80	0.44
1.2	土地整治*	hm ²	0.1798	41271.31	0.74
2	跨越场区	/	/	/	0.08
2.1	土地整治	hm ²	0.02	41271.31	0.08
3	施工道路区	/	/	/	0.52
3.1	土地整治	hm ²	0.126	41271.31	0.52
4	电缆施工区	/	/	/	18.54
4.1	表土剥离*	100m ³	18.14	2490.80	4.52
4.2	土地整治*	hm ²	3.3963	41271.31	14.02
合计	/	/	/	/	20.32

表 3.1-3 水土保持植物措施投资估算表 单位：万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
1	塔基区	/	/	/	0.13
1.1	撒播草籽*	hm ²	0.0644	20191.11	0.13

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
2	跨越场区	/	/	/	0.04
2.1	撒播草籽	hm ²	0.02	20191.11	0.04
3	施工道路区	/	/	/	0.15
3.1	撒播草籽	hm ²	0.075	20191.11	0.15
4	电缆施工区	/	/	/	1.84
4.1	撒播草籽*	hm ²	0.9105	20191.11	1.84
合计	/	/	/	/	2.16

表 3.1-4 水土保持临时措施投资估算表 单位: 万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
1	塔基区	/	/	/	1.88
1.1	泥浆沉淀池*	座	4	2800	1.12
1.2	防尘网苫盖	100m ²	10	538.60	0.54
1.3	土质排水沟	100m ³	0.22	3428.47	0.08
1.4	土质沉沙池	座	4	361.59	0.14
2	跨越场区	/	/	/	0.14
2.1	彩条布铺垫	100m ²	1.8	768.64	0.14
3	施工道路区	/	/	/	8.80
3.1	铺设钢板*	m ²	1100	80	8.80
4	电缆施工区	/	/	/	16.79
4.1	泥浆沉淀池*	座	4	2800	1.12
4.2	防尘网苫盖	100m ²	270	538.60	14.54
4.3	土质排水沟	100m ³	2.05	3428.47	0.70
4.4	土质沉沙池	座	12	361.59	0.43
合计	/	/	/	/	27.61

注: 带“*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-5 本工程水土保持其他费用估算详表

编号	工程或费用名称	计算依据	合计
1	建设管理费	(第一~第三部分)×2%	1.00
2	设计费	/	5.00
3	水土保持监理费	(第一~第三部分)×2.5%	1.25
4	水土保持设施验收费	/	6.00
合计			13.25
防治责任范围(m ²)		单价(元/m ²)	水土保持补偿费(元)
37300		1.00	37300

3.2 效益分析

3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年,项目建设可能造成水土流失面积 37300m²,水土流失治理

达标面积 37216m²，水土流失治理度可达 99.8%。具体计算见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失治理度计算表

防治分区	扰动土地面积 (m ²)	水土流失面积 (m ²)	水土流失治理达标面积 (m ²)				水土流失治理度 (%)	防治标准 (%)	是否达标
			建筑物及场地道路硬化面积	工程措施	植物措施	小计			
塔基区	1810	1810	12	1154	627	1793	99.8	98	是
跨越场区	200	200	0	0	184	184			
施工道路区	1260	1260	0	510	723	1233			
电缆施工区	34030	34030	67	24858	9081	34006			
合计	37300	37300	79	26522	10615	37216			

注：水土流失治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

3.2.2 土壤流失控制比

通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内的平均土壤侵蚀模数将小于本工程容许土壤侵蚀模数为 500t/(km²·a)，至设计水平年，各项水保措施发挥作用后，土壤侵蚀模数可达到 150t/(km²·a)，控制比可达到 3.3。

3.2.3 渣土防护率

本项目永久弃渣和临时堆土量约 18598m³，实际挡护的永久弃渣及临时堆土量约 18540m³，渣土防护率达到 99.7%。

3.2.4 表土保护率

本项目可剥离表土总量为 11190m³，在采取保护措施后保护表土数量为 10776m³，其中剥离保护的表土 1992m³，通过苫盖和铺垫保护的表土量为 8784m³，表土保护率为 96.3%。

3.2.5 林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积 10699m²，林草类植被面积 10615m²，林草植被恢复率达 99.2%。

表 3.2-2 林草植被恢复率计算表

防治分区	可恢复植被面积 (m ²)	林草植被面积 (m ²)	林草植被恢复率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
塔基区	644	627	99.2	98	是
跨越场区	200	184			
施工道路区	750	723			
电缆施工区	9105	9081			
合计	10699	10615			

3.2.6 林草覆盖率

本工程建设区总面积 37300m²，恢复耕地面积 26522m²，扣除恢复耕地后面积 10778m²，林草类植被面积 10615m²，林草覆盖率达 98.5%。

表 3.2-3 林草覆盖率统计表

防治分区	防治责任范围(m ²)	恢复耕地面积(m ²)	扣除恢复耕地后面积(m ²)	林草类植被面积(m ²)	林草覆盖率(%)	防治标准(%)	是否达标
塔基区	1810	1154	656	627	98.5	27	是
跨越场区	200	0	200	184			
施工道路区	1260	510	750	723			
电缆施工区	34030	24858	9172	9081			
合计	37300	26522	10778	10615			

3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析，至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为：水土流失治理度 99.1%、土壤流失控制比 3.3、渣土防护率 99.7%、表土保护率 95.8%、林草植被恢复率 99.2%、林草覆盖率 98.5%。

表 3.2-4 防治效果汇总表

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
水土流失治理度(%)	项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比	水土流失治理达标面积	m ²	37216	99.8	98	达标
		水土流失总面积	m ²	37300			
土壤流失控制比	项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比	容许土壤流失量	t/(km ² ·a)	500	3.3	1.0	达标
		侵蚀模数达到值	t/(km ² ·a)	150			
渣土防护率(%)	项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比	拦挡永久弃渣及临时堆土量	m ³	18540	99.7	99	达标
		永久弃渣及临时堆土总量	m ³	18598			
表土保护率(%)	项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比	保护的表土数量	m ³	10776	96.3	92	达标
		可剥离表土总量	m ³	11190			
林草植被恢复率(%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比	林草类植被面积	m ²	10615	99.2	98	达标
		可恢复林草植被面积	m ²	10699			
林草覆盖率(%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比	林草类植被面积	m ²	10615	98.5	27	达标
		项目建设区面积(扣除恢复耕地后面积)	m ²	10778			

3.3 水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

3.3.1 组织管理

根据国家有关法律法规，本工程水土保持方案为报告表项目，实施承诺制管理。建设单位承诺已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求；严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；积极配合水土保持监督检查；愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。水土保持方案在报批前，生产建设单位应当通过其网站、生产建设项目所在地公共媒体网站或者相关政府网站向社会公开拟报批的水土保持方案全文，且持续公开期限不得少于10个工作日。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持行政许可承诺书中予以说明。

报告表经江苏省水利厅批复后，建设单位将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，全力保证水土保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机构主要工作职责如下：①认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；②建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案详细实施计划；③工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持

设施的正常建设,最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏;④深入工程现场进行检查,掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况;⑤建立、健全各项档案,积累、分析整编资料,为水土保持工程验收提供相关资料。

3.3.2 后续设计

本项目处于可研阶段,水土保持应纳入初步设计中。水土保持方案经批准后,对照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号),生产建设项目地点、规模发生重大变化,水土保持措施发生重大变更的,生产建设单位应当补充水土保持方案变更报告或修改水土保持方案,报原审批机关审批。

3.3.3 水土保持监测和监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号)中相关规定。对报告表项目水土保持监测工作未提出要求,因此,本工程建设单位可依据需要自行开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的生产建设项目,应当按照国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工合同、监理合同等,开展水土保持监理工作,由于本工程征占地面积在50公顷以下且挖填土石方总量在50万立方米以下,因此不对水土保持监理单位的人员配备和资质提出要求。

3.3.4 水土保持施工

施工过程中应注重保护表土植被,严格控制和管理车辆机械的运行范围,必要时设立保护地表及植被的警示牌,防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进行经常性检查维护,保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。工程措施施工时,应对施工质量实时检查,对不符合设计要求或质量要求的工程,责令其重建,直到满足要求为止。植物措施工程施工时,应注意加强植物措施的后期管护工作,确保各种植物的成活率,发挥植物措施的水土保持效益。

3.3.5 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号)和《生产建设项目水土保持管理办法》(水利部令第53

号)，生产建设项目的水土保持设施验收，由生产建设单位自主开展。


生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收鉴定书，公示时间不得少于 20 个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时处理或者回应。生产建设单位、验收报告编制单位和水土保持监测单位分别对各自所出具材料的真实性负责。

生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，验收通过 3 个月内向江苏省水利厅报备验收材料。依法编制水土保持报告表和实行承诺制管理的生产建设项目，水土保持设施验收报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。

生产建设项目水土保持设施验收合格后，生产建设单位或者运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

附

图



江苏扬州西园220千伏变电站110千伏送出工程



附图1 项目地理位置图
