

江苏镇江500kV上党变220kV配套线路  
改造工程建设项目竣工环境保护  
验收调查报告表

建设单位： 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期： 二〇二二年九月

# 目 录

表 1	建设项目总体情况 .....	1
表 2	调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 .....	3
表 3	验收执行标准 .....	6
表 4	建设项目概况 .....	7
表 5	环境影响评价回顾 .....	10
表 6	环境保护措施执行情况 .....	13
表 7	电磁环境、声环境监测 .....	16
表 8	环境影响调查 .....	22
表 9	环境管理及监测计划 .....	26
表 10	竣工环保验收调查结论与建议 .....	28

表 1 建设项目总体情况

建设项目名称	江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司				
法人代表/授权代表	王 勇	联系人	李若冰		
通讯地址	镇江市电力路 182 号				
联系电话	0511-80291990	传真	/	邮政编码	212000
建设地点	镇江市丹徒区境内				
项目建设性质	新建√改扩建□技改□	行业类别	电力供应, D4420		
环境影响报告表名称	江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程环境影响报告表				
环境影响评价单位	江苏方天电力技术有限公司				
初步设计单位	江苏科能电力工程咨询有限公司				
环境影响评价审批部门	镇江市生态环境局	文号	镇环审〔2020〕14 号	时间	2020.2.3
建设项目核准部门	江苏省发展和改革委员会	文号	苏发改能源发〔2018〕571 号	时间	2018.6.15
初步设计审批部门	国网江苏省电力有限公司	文号	苏电建〔2019〕496 号	时间	2019.6.17
环境保护设施设计单位	江苏科能电力工程咨询有限公司				
环境保护设施施工单位	江苏省送变电有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏省苏核辐射科技有限责任公司				
投资总概算(万元)	5182	环境保护投资(万元)	30	环境保护投资占总投资比例	0.58%
实际总投资(万元)	5788	环境保护投资(万元)	40	环境保护投资占总投资比例	0.69%

<p>环评阶段项目建设内容</p>	<p><b>(1) 220kV 上党至官塘线路改造工程:</b> 线路路径全长约8.3km, ①其中220kV同塔双回架设段长约6.5km; ②220kV/110kV (备用) 混压同塔四回架设段长约1.4km; ③220kV四回架设段长约0.4km。220kV 导线采用2×JL/G1A-630/45, 110kV导线采用2×JL/G1A-300/25; 拆除线路约9.0km (折单), 拆除铁塔35 基。</p> <p><b>(2) 220kV上党至零横线路改造工程:</b> 线路路径全长约0.6km, ①其中同塔双回架设段长约0.3km; ②同塔四回架设段长约0.3km。拆除线路约0.6km (折单), 铁塔1基。</p> <p><b>(3) 220kV上党至华山线路改造工程:</b> 2回, 线路路径全长约0.8km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.6km, 拆除铁塔2 基。</p> <p><b>(4) 220kV上党至华山第二通道线路改造工程:</b> 2回, 线路路径全长约1.6km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.8km, 拆除铁塔3 基。</p> <p><b>(5) 220kV上党至镇江电厂线路改造工程:</b> 2回, 线路路径全长约2.0km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35。</p>	<p>项目开工日期</p>	<p>2020.9.27</p>
<p>项目实际建设内容</p>	<p><b>(1) 220kV 上党至官塘线路改造工程:</b> 线路路径全长7.8km, ①其中220kV同塔双回架设段长6.5km; ②220kV/110kV (备用) 混压同塔四回架设段长0.9km; ③220kV四回架设段长0.4km。220kV导线采用2×JL/G1A-630/45, 110kV导线采用2×JL/G1A-300/25; 拆除线路9.0km (折单), 拆除铁塔28基。</p> <p><b>(2) 220kV上党至零横线路改造工程:</b> 线路路径全长0.4km, ①其中同塔双回架设段长0.24km; ②同塔四回架设段长0.14km。拆除线路0.6km (折单), 铁塔1基。</p> <p><b>(3) 220kV上党至华山线路改造工程:</b> 2回, 线路路径全长0.8km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.6km, 拆除铁塔2 基。</p> <p><b>(4) 220kV上党至华山第二通道线路改造工程:</b> 2回, 线路路径全长1.7km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.8km, 拆除铁塔4 基。</p> <p><b>(5) 220kV上党至镇江电厂线路改造工程:</b> 2回, 线路路径全长 1.72km, 同塔双回架设, 导线采用 2×JL/G1A-400/35。</p>	<p>环境保护设施投入调试日期</p>	<p>2022.8.5</p>
<p>项目建设过程简述</p>	<p>本工程线路于 2020 年 9 月 27 日开工, 2022 年 8 月 5 日完成竣工初检。工程于 2022 年 8 月 5 日投入调试。</p>		

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

## 调查范围

验收调查范围与环境影响评价文件的评价范围一致，详见表 2-1。

表 2-1 调查范围

调查对象	调查内容	调查范围
220kV 架空线路	电磁环境	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域
	声环境	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内区域
	生态环境	边导线地面投影外两侧各 300m 范围内区域 (不进入生态敏感区线路段)

## 环境监测因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ 705-2020) 确定环境监测因子:

- (1) 电磁环境: 工频电场、工频磁场。
- (2) 声环境: 噪声。

### 环境敏感目标

电磁环境保护目标为线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为线路调查范围内依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。

经踏勘，220kV 线路调查范围有 20 处敏感目标。

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），本工程调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号），本工程调查范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。

### 调查重点

- (1) 项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。
- (2) 核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。
- (3) 环境敏感目标基本情况及变动情况。
- (4) 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。
- (5) 环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果。
- (6) 环境质量和环境监测因子达标情况。
- (7) 建设项目环境保护投资落实情况。

表 3 验收执行标准

**电磁环境标准**

《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014) 表 1 中频率 50Hz 所对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 $\mu$ T 作为验收监测的执行标准(公众曝露控制限值)。架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。

**声环境标准**

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。

表 3-1 本工程噪声验收执行标准

工程名称	声环境质量标准
江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程	1 类、2 类、4a 类

表 3-2 本工程声环境验收执行标准限值

标准名称、标准号	标准分级	标准限值 (dB(A))	
		昼间	夜间
《声环境质量标准》(GB 3096-2008)	1 类	55	45
	2 类	60	50
	4a 类	70	55

**其他标准和要求**

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响报告表及其审批部门批复中规定的标准,在环境影响报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行标准有明确时限要求的,按新发布或修订的标准执行。本项目验收执行标准不涉及新发布或修订标准的情况。



表 4 建设项目概况

<p><b>项目建设地点</b></p>
<p>本工程 220kV 配套线路位于镇江市丹徒区境内。</p>
<p><b>主要建设内容及规模</b></p>
<p><b>(1) 220kV 上党至官塘线路改造工程:</b></p>
<p>线路路径全长7.8km, ①其中220kV同塔双回架设段长6.5km; ②220kV/110kV (备用) 混压同塔四回架设段长0.9km; ③220kV四回架设段长0.4km。220kV导线采用2×JL/G1A-630/45, 110kV导线采用2×JL/G1A-300/25; 拆除线路9.0km (折单), 拆除铁塔28基。线路调度名称为220kV官上2935/2936线。</p>
<p><b>(2) 220kV上党至零横线路改造工程:</b></p>
<p>线路路径全长0.4km, ①其中同塔双回架设段长0.24km; ②同塔四回架设段长0.14km。拆除线路0.6km (折单), 铁塔1基。线路调度名称为220kV零上2Y53/2Y54线/220kV上丹2Y51/2Y52线。</p>
<p><b>(3) 220kV上党至华山线路改造工程:</b></p>
<p>2回, 线路路径全长0.8km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.6km, 拆除铁塔2基。线路调度名称为220kV上华2933/2934线。</p>
<p><b>(4) 220kV上党至华山第二通道线路改造工程:</b></p>
<p>2回, 线路路径全长1.7km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.8km, 拆除铁塔3基。线路调度名称为220kV上华2929/2930线。</p>
<p><b>(5) 220kV上党至镇江电厂线路改造工程:</b></p>
<p>2回, 线路路径全长 1.72km, 同塔双回架设, 导线采用 2×JL/G1A-400/35。线路调度名称为 220kV 镇上 4W55/4W56 线。</p>

**建设项目占地及总平面布置、输电线路路径**

## ● 建设项目占地：

220kV 线路新建杆塔共 45 基，其中角钢塔 36 基、钢管塔 9 基，永久占地 153m<sup>2</sup>，临时占地已进行植被恢复。根据《江苏省电力条例》第十八条 架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）建设不实行征地。

## ● 输电线路路径：

220kV 上党至官塘线路改造工程：220kV 线路自 500kV 上党变东南侧架空出线向东跨越 S265 后折向东北方向架设，至克莱维鞋业南侧折向东南方向架设，至西麓村南侧折向东北方向架设，至巫山庙北侧折向北架设，至镇江氧气有限公司南侧折向东架设，至兴园路折向北架设与原有线路搭接。

220kV 上党至零横线路改造工程：220kV 线路自 500kV 上党变东南侧（S265 东侧）原有线路起始点向东北方向架设，至克莱维鞋业折向东架设与原有线路搭接。

220kV 上党至华山线路改造工程：220kV 线路自 500kV 上党变东北侧原有杆塔向西北方向架设约 0.8km 与原有线路搭接。

220kV 上党至华山第二通道线路改造工程：220kV 线路自 500kV 上党变西侧向西架设至金豫银杏生态园东侧，折向北架设与原有线路搭接。

220kV 上党至镇江电厂线路改造工程：220kV 线路自 500kV 上党变西侧向西架设至金豫银杏生态园与原有线路搭接。

**建设项目环境保护投资**

本工程投资总概算 5182 万元，环境保护投资 30 万元，环境保护投资占总投资比例 0.58%；实际总投资 5788 万元，环境保护投资 40 万元，环境保护投资占总投资比例 0.69%。

### 建设项目变动情况及变动原因

#### 1、工程建设内容变化情况

本工程验收阶段与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。

#### 2、敏感目标变化情况

本工程调查范围内环境敏感目标与环评阶段略有变化。对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程验收项目的工程变动内容不属于重大变动。

### 项目分期验收情况

本次验收的江苏镇江500kV上党变220kV配套线路改造工程不存在分期验收情况。

## 表 5 环境影响评价回顾

### 环境影响评价的主要环境影响预测及结论

#### 1、生态环境：

本工程线路周围均为已开发区域，工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复等措施，本工程建设对周围生态环境影响很小。

#### 2、电磁环境：

通过理论计算和类比分析，在满足报告表要求的前提下，配套220kV架空输电线路周围的工频电场、工频磁场、可满足相关的标准限值。

220kV线路必须跨越电磁环境保护目标时，还应按本报告要求保持足够的垂直距离，确保环境保护目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

具体要求如下：

表 5-1 本工程环评阶段时不同情况下导线对地高度要求      单位：m

工程名称	敏感目标类型	220kV 双 回同相序	220kV 双 回逆向序	220kV 四 回同相序	220kV 四 回逆向序	220kV/110kV 混压四回同相 序	220kV/110kV 混压四回逆相 序
江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配 套线路改造工程	有人驻 留的最 高楼层	12	9	14	9	8	5

#### 3、声环境：

施工时选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工。

通过理论计算和类比分析，在满足报告表要求的前提下，配套220kV架空输电线路周围的噪声也可满足相关的标准限值。

#### 4、水环境：

施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理；施工人员产生的生活污水排入临时化粪池，及时清理。

#### 5、固体废物：

施工建筑垃圾和生活垃圾及时清运至指定收纳点。

### 环境影响评价文件批复意见

你公司委托江苏方天电力技术有限公司编制完成了《江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究批复如下：

环评批复主要意见如下：

一、工程构成及规模如下（详见《报告表》）：

（1）220kV 上党至官塘线路改造工程：

本工程线路路径长约8.3km，其中220kV双回段 $2\times 6.5\text{km}$ ；220kV/110kV混压四回段 $4\times 1.4\text{km}$ ；220kV四回段 $2\times 0.4\text{km}$ ；

（2）220kV上党至零横线路改造工程：

本工程线路路径长约0.6km，其中双回段 $2\times 0.3\text{km}$ ，四回段 $2\times 0.3\text{km}$ ；

（3）220kV上党至华山线路改造工程：

本工程线路路径长约0.8km。同塔双回架设。

（4）220kV上党至华山第二通道线路改造工程：

本工程线路路径长约1.6km，同塔双回架设。

（5）220kV上党至镇江电厂线路改造工程：

本工程线路路径长约2.0km，同塔双回架设

该输变电工程符合国家产业政策。在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和管理措施的前提下，能够满足环境保护的相关要求，根据《报告表》评价结论、镇江市环境保护服务中心技术评估意见（镇环辐咨[2020]1号），从生态环境角度考虑，该项目具备可行性。

二、在工程建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）确保工程运行后附近有人居住的建筑物处能满足工频电场不大于  $4000\text{V/m}$ ，工频磁感应强度不大于  $100\mu\text{T}$ 。

（三）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，避免发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（四）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保

“三同时”制度。项目试运行时，建设单位应按规定履行环保竣工验收程序。项目建设期间的现场监督管理由镇江市丹徒生态环境局负责。

四、你公司对应所提供的项目环评报告中描述内容的真实性负责，如有不实描述，本批复自动失效。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施	环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因
前期	生态影响	<p>(1) 线路尽可能减少新增土地占用面积，并注意生态环境的保护。</p> <p>(2) 项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。</p>	<p><b>已落实：</b></p> <p>(1) 已优化设计，线路采用同塔双回、四回架设，减少了土地占用。</p> <p>(2) 项目已取得相关规划部门同意。</p>
	污染影响	<p>(1) 优化导线相间距离以及导线布置方式，降低输电线路电磁环境影响。</p> <p>(2) 线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地高度等措施。220kV 架空输电线路应达到《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中规定的有关净空高度、防护距离的要求。</p>	<p><b>已落实：</b></p> <p>(1) 优化了导线相间距离及导线布置方式，降低了输电线路电磁环境影响。</p> <p>(2) 优化了线路路径，尽可能避开了居民区等环境敏感目标，提高了导线对地高度，线路跨越居民住宅等环境敏感目标时，其净空距离满足环评报告表中提出的要求。</p>

	生态影响	<p>(1) 加强文明施工, 采取土工膜覆盖等措施。材料运输过程中, 应充分利用现有公路。材料运至施工场地后, 应合理布置, 减少临时占地。施工结束后及时撤出临时占用场地, 拆除临时设施, 恢复地表植被, 尽量保持原有生态原貌, 塔基等占用的土地进行固化处理或绿化。</p> <p>(2) 加强施工期环境保护, 落实各项环保措施, 尽量减少土地占用和对植被的破坏, 减少噪声、扬尘等扰民现象, 降低施工对周边环境的影响。</p>	<p><b>已落实:</b></p> <p>(1) 加强了文明施工, 松散土及时进行了清运, 并建设了挡土护体措施。材料运输充分利用了现有公路。施工组织合理, 减少了临时施工用地。塔基开挖时, 进行了表土剥离, 将表土和熟化土分开堆放。施工结束后, 临时占地和临时道路已经按要求进行恢复。线路塔基植被恢复良好。</p> <p>(2) 已加强施工期环境保护, 落实了各项环保措施, 减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对施工现场、塔基周围进行了植被恢复。</p>
施 工 期	污染影响	<p>(1) 运输散体材料时密闭, 施工现场设置围挡, 弃土合理堆放, 定期洒水, 对空地硬化和覆盖, 减少裸露地面面积。</p> <p>(2) 施工废水排入临时沉淀池, 去除悬浮物后的废水循环使用不外排, 沉渣定期清理; 施工人员产生的生活污水排入临时化粪池, 及时清理。</p> <p>(3) 施工建筑垃圾和生活垃圾及时清运至指定收纳点。</p> <p>(4) 施工时选用低噪声施工设备, 尽量错开高噪声设备使用时间, 夜间不施工。</p> <p>(5) 严格按照环保要求和设计规范进行建设。</p> <p>(6) 加强施工期环境保护, 落实各项环保措施, 尽量减少土地占用和对植被的破坏, 避免发生噪声和扬尘等扰民现象, 将施工对环境的影响降到最低。</p>	<p><b>已落实:</b></p> <p>(1) 运输散体材料时密闭, 施工现场设置围挡, 弃土合理堆放, 定期洒水, 对空地硬化和覆盖, 减少了裸露地面面积。</p> <p>(2) 施工期所产生的污水主要为生产废水和生活污水, 由施工单位进行统一收集, 定期清理。</p> <p>(3) 建筑垃圾由渣土公司清运, 施工生活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。本工程拆除的线路、地线及铁塔由建设单位统一回收处理并进行了土地功能恢复。</p> <p>(4) 已选用低噪声机械设备, 定期维护保养; 未在夜间施工。</p> <p>(5) 已严格按照环保要求及设计规范建设。</p> <p>(6) 工程在施工期落实了各项环保措施, 未发生噪声和扬尘等扰民现象。</p>



环 境 保 护 设 施 调 试 期	生态 影响	<p>(1) 加强线路塔基周围进行植被恢复, 以改善运行环境。</p> <p>(2) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。</p>	<p><b>已落实:</b></p> <p>(1) 已按要求对线路塔基周围进行植被恢复。</p> <p>(2) 生态保护防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。</p>
	污染 影响	<p>(1) 严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施, 确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 限值要求。</p> <p>(2) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后, 须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后, 项目方可正式投入运行。</p> <p>(3) 本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的, 应重新报批项目的环境影响评价文件。</p>	<p><b>已落实:</b></p> <p>(1) 已严格按照环保要求及设计规范建设, 优化线路路径, 线路跨越环境敏感目标时, 其净空距离满足环评报告表提出的要求, 详见表 8-2。监测结果表明, 敏感目标测点处的工频电场、工频磁场满足相应的控制限值要求。</p> <p>(2) 本工程执行了“三同时”制度, 环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程目前正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号) 要求开展竣工环境保护验收工作。</p> <p>(3) 本工程自批复下达之日起五年内开工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施未发生重大变动。</p>

**表 7 电磁环境、声环境监测**

<p><b>监测因子及监测频次</b></p> <p>1、监测因子：工频电场、工频磁场</p> <p>2、监测频次：监测 1 次</p>
<p><b>监测方法及监测布点</b></p> <p>按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ 705-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法。</p>
<p><b>监测单位、监测时间、监测工况</b></p> <p>1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司</p> <p>2、监测时间：2022 年 8 月 15 日</p> <p>3、监测工况：监测时项目正常运行</p>

## 监测仪器及工况

### 1、监测仪器：

#### 工频场强仪

主机型号：NBM550，主机编号：G-0201

探头型号：EHP-50F，探头编号：000WX50912

校准有效期：2021.11.29~2022.11.28

生产厂家：Narda 公司

频率响应：1Hz-400kHz

工频电场测量范围：5mV/m~1kV/m&500mV/m~100kV/m

工频磁场测量范围：0.3nT~100μT&30nT~10mT

校准单位：江苏省计量科学研究院

校准证书编号：E2021-0114159



### 监测结果分析

监测结果表明，江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程线路周围测点处工频电场强度为 6.2V/m~514.2V/m，工频磁感应强度为 0.027 $\mu$ T~0.476 $\mu$ T。

监测结果表明，本次验收的输变电工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的控制限值要求，且满足架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m 的要求。

**监测因子及监测频次**

- 1、监测因子：噪声。
- 2、监测频次：昼、夜间各监测一次

**监测方法及监测布点**

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法。

**监测单位、监测时间、监测工况**

- 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司
- 2、监测时间：2022 年 8 月 15 日
- 3、监测工况：监测时项目正常运行

## 监测仪器及工况

### 1、监测仪器：

#### AWA6228 声级计

仪器编号：110413

检定有效期：2021.10.9-2022.10.8

测量范围：25 dB (A) ~125dB (A)

频率范围：10Hz~20kHz

检定单位：江苏省计量科学研究院

检定证书：E2021-0095165



#### AWA6221A 声校准器

仪器编号：AWA6221A0640

频率：1000Hz

检定单位：江苏省计量科学研究院

检定有效期：2021.11.26-2022.11.25

校准证书编号：E2021-0114164



### 监测结果分析

监测结果表明，江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程线路周围声环境保护目标测点处昼间噪声为 44dB(A)~45dB(A)，夜间噪声为 41dB(A)~42dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准要求。

表 8 环境影响调查

<p><b>施工期</b></p>
<p><b>生态影响</b></p> <p><b>1、生态保护目标调查</b></p> <p>根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。</p> <p>根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。</p> <p>对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。</p> <p>对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），本工程调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。</p> <p>对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程调查范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。</p> <p><b>2、自然生态影响调查</b></p> <p>根据现场调查，本工程线路沿线主要为农田、道路等地区，工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。</p> <p>本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。</p> <p><b>3、农业生态影响调查</b></p> <p>工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。</p> <p><b>4、生态保护措施有效性分析</b></p> <p>调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。</p>
<p><b>污染影响</b></p> <p>线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环境的影响较小。</p>



线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输会产生扬尘，短时间影响周围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束已恢复。

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。施工营地废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。

本工程拆除的线路、地线及铁塔由建设单位统一回收处理并进行了土地功能恢复。

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理，对周围环境影响较小。施工期采取的环保措施照片，见图 8-1。

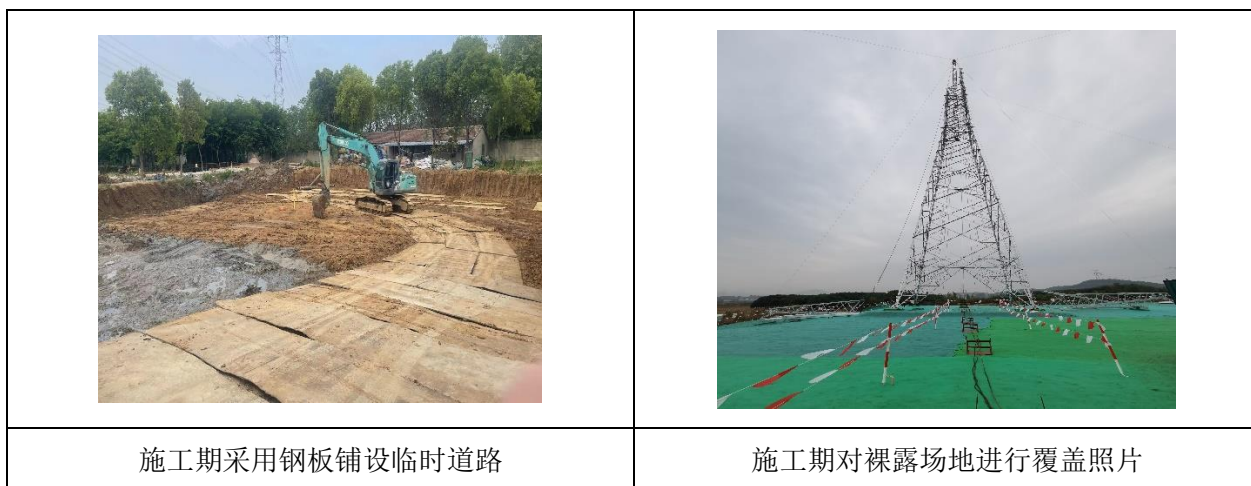


图 8-1 施工期采取的环保措施照片

## 环境保护设施调试期

### 生态影响

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。

通过现场调查确认，本工程施工建设及调试期阶段很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发现施工弃土随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失问题的现象。线路塔基周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。项目周围生态环境恢复情况见图 8-2。

	
<p>220kV 官上 2936/2935 线同塔双回架设</p>	<p>220kV4L09/4L10 线与 2 回未通电线路同塔四回架设</p>
	
<p>220kV4W55/456 镇上线#64 塔基周围生态恢复示例</p>	<p>220kV2929/2930 上华线#3 塔基周围生态恢复示例</p>
	
<p>220kV2933/2934 上华线#3 塔基周围生态恢复示例</p>	

图 8-2 本工程生态恢复示例照片

## 污染影响

### 1、电磁环境调查

本工程输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收监测结果表明，输电线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁

场  $100\mu\text{T}$  的公众曝露控制限值要求。

本次验收调查时对同塔双回及混压同塔四回架空线路的相序排列方式进行了现场核查，核查结果表明，由于线路开断环入，综合考虑调度等方面因素，本工程架空线路采用了双回同相序及异相序排列。

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响验收时现场对所有跨越点线路对地高度进行了核查，跨越点的线路对地高度均能够满足环评阶段所提出的高度要求。

## 2、声环境影响调查

本工程线路沿线声环境保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

**表 9 环境管理及监测计划****环境管理机构设置**

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

**(1) 施工期**

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。镇江供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，公司设立了环保管理机构，设有环保专职。

**(2) 环境保护设施调试期**

输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；镇江供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境状况及声环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

**环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况**

根据相关规定，工程竣工投入调试期后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投入调试期后结合竣工环境保护验收监测一次，其后有环保投诉时进行监测。

项目建成投入调试期后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对输变电工程电磁环境和声环境进行了竣工环保验收监测。

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。

表 9-1 运营期监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	线路及附近环境敏感目标
		环境监测因子	工频电场强度 (kV/m)、工频磁感应强度 ( $\mu\text{T}$ )
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》(HJ681-2013)
		监测频次和时间	线路工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 其后有群众反映时进行监测。
2	噪声	点位布设	线路及附近声环境保护目标
		环境监测因子	昼间、夜间等效声级, $L_{eq}$ , dB(A)
		监测方法	《声环境质量标准》(GB3096-2008)
		监测频次和时间	线路工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 其后有群众反映时进行监测。

建设单位建立了环保设施运行台帐, 各项环保档案资料 (如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等) 及时归档, 由档案管理员统一管理, 负责登记归档并保管。

### 环境管理状况分析

经过调查核实, 施工期及调试期环境管理状况较好, 认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

- (1) 建设单位环境管理组织机构健全。
- (2) 环境管理制度和应急预案完善。
- (3) 环保工作管理规范。本项目执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

表 10 竣工环保验收调查结论与建议

**调查结论**

根据对镇江供电公司江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程的环境现状监测以及对工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查,从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

**1、工程基本情况**

(1) 220kV 上党至官塘线路改造工程:

线路路径全长7.8km, ①其中220kV同塔双回架设段长6.5km; ②220kV/110kV (备用)混压同塔四回架设段长0.9km; ③220kV四回架设段长0.4km。220kV导线采用2×JL/G1A-630/45, 110kV导线采用2×JL/G1A-300/25; 拆除线路9.0km (折单), 拆除铁塔28基。线路调度名称为220kV官上2935/2936线。

(2) 220kV上党至零横线路改造工程:

线路路径全长0.4km, ①其中同塔双回架设段长0.24km; ②同塔四回架设段长0.14km。拆除线路0.6km (折单), 铁塔1基。线路调度名称为220kV零山2Y53/2Y54线/220kV上丹2Y51/2Y52线。

(3) 220kV上党至华山线路改造工程:

2回, 线路路径全长0.8km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.6km, 拆除铁塔2基。线路调度名称为220kV上华2933/2934线。

(4) 220kV上党至华山第二通道线路改造工程:

2回, 线路路径全长1.7km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35; 拆除线路2×0.8km, 拆除铁塔4基。线路调度名称为220kV上华2929/2930线。

(5) 220kV上党至镇江电厂线路改造工程:

2回, 线路路径全长1.72km, 同塔双回架设, 导线采用2×JL/G1A-400/35。线路调度名称为220kV镇上4W55/4W56线。

本工程总投资5788万元, 其中环保投资40万元。

**2、环境保护措施执行情况**

本次验收的江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施, 各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已基本得到落实。

**3、生态环境影响调查**

根据相关技术规范, 本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本项目验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），本工程调查范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程调查范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，线路周围的土地已恢复原貌，线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

#### 4、污染环境的影响调查

##### （1）电磁环境影响调查

本次验收的江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程调试期间，输电线路周围、敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应控制限值要求。

##### （2）声环境影响调查

本次验收的线路沿线声环境保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

#### 5、环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

#### 6、验收调查总结论

综上所述，镇江供电公司本次验收的江苏镇江 500kV 上党变 220kV 配套线路改造工程已认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。

#### 建议

加强输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。
